


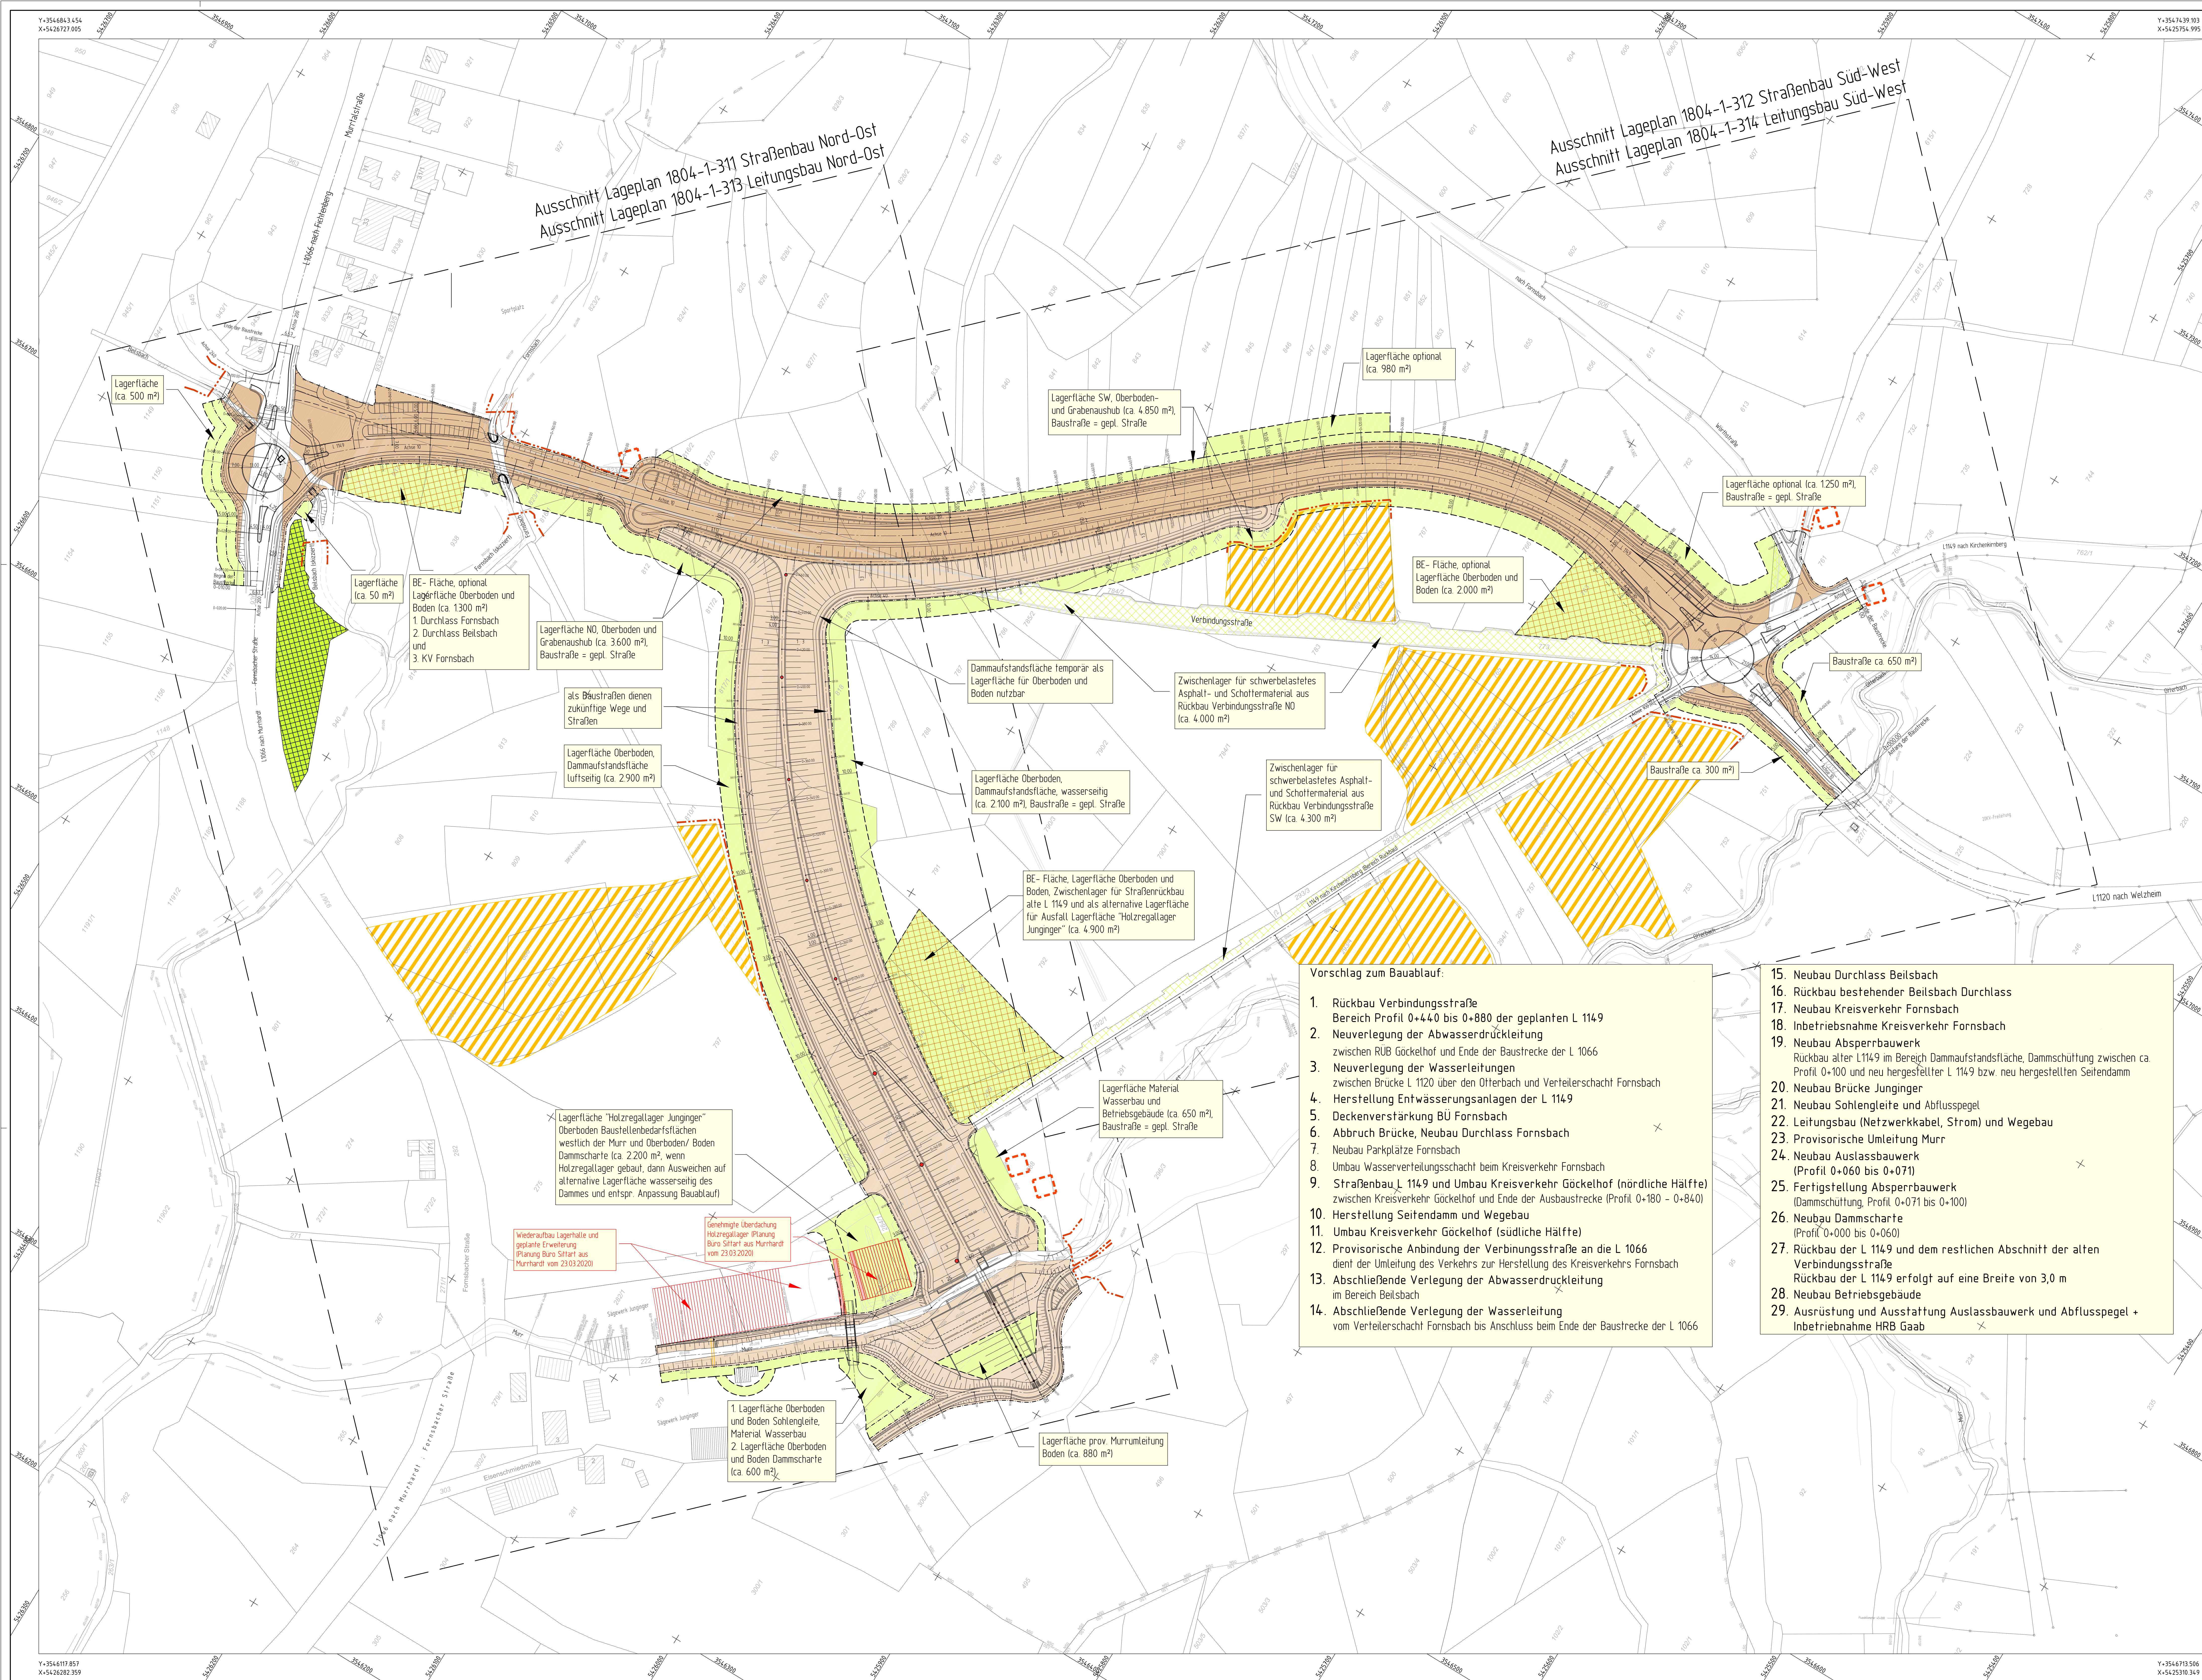

Legende

dauerhaft zu belastende Flächen (Straßenbau)

dauerhaft zu belastende Flächen (Hochwasserrückhaltebecken)

vorbereitend zu belastende Flächen (Lagerfläche und Baustreife)

vorbereitend zu belastende Flächen (BE Fläche)

zu renaturierende Fläche

Offenlandtopkartierung

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

LEGENDE - aus dem LBP Maßnahmenplan

Vermeidungsmaßnahmen, die während der Bauausführung zwingend zu berücksichtigen sind

1 V

Minimierung der vorübergehenden Flächenanspruchnahme auf das notwendige Maß

Bestände mit hohem Naturschutzfachlichen Wert als Tabulflächen ausweisen

Tabulflächen keine Lager- und Baustellenanordnungen, Baufeld auf das unbedingt notwendige Maß reduzieren (**1 V**)

2 V

Schutz von Vegetationsbeständen während der Bauphase (entspr. RAS LP4) (Schutzzaun/Absperriband)

Schutz von Vegetationsflächen Schutzzaun bzw. Absperriband (**2 V**)

3 V

Baumschutz während der Bauphase Schutz von straßenbegleitenden Bäumen (entspr. RAS LP4) im Kronen-, Stamm- bzw. Wurzelbereich

Baumschutz während der Bauphase im Stamm-, Kronen- bzw. Wurzelbereich (**3 V**)

13ACEF

Ausgleichsmaßnahme, die während der Bauausführung als Tabulfläche gilt

Entwicklung eines Habitats für den Dunklen Wiesenkriech-Amesenbäumchen

Entwicklung eines Ausgleichsmaßnahme für den Dunklen Wiesenkriech-Amesenbäumchen als vorgesehene CEP-Maßnahme durch extensive, an die oberirdische Entwicklungsphase der Art angepasste Nutzung (jährliche Herabnahme ab Mitte September) sowie Erbringen von Wiesenkriech-Pflanzen durch Rhizomverpflanzung und/oder Heumulchsaat (**13ACEF**)

- Vorschlag zum Bauablauf:
1. Rückbau Verbindungsstraße Bereich Profil 0+440 bis 0+880 der geplanten L 1149
 2. Neuverlegung der Abwasserdruckleitung zwischen RUB Gockelhof und Ende der Baustrecke der L 1066
 3. Neuverlegung der Wasserleitungen zwischen Brücke L 1120 über den Offenbach und Verteilerschacht Fornsbach
 4. Herstellung Entwässerungsanlagen der L 1149
 5. Deckenverstärkung BÜ Fornsbach
 6. Abbruch Brücke, Neubau Durchlass Fornsbach
 7. Neubau Parkplätze Fornsbach
 8. Umbau Wasserverteilungsschacht beim Kreisverkehr Fornsbach
 9. Straßenbau L 1149 und Umbau Kreisverkehr Gockelhof (nördliche Hälfte) zwischen Kreisverkehr Gockelhof und Ende der Ausbaustrecke (Profil 0+180 - 0+840)
 10. Herstellung Seifendamm und Wegebau
 11. Umbau Kreisverkehr Gockelhof (südliche Hälfte)
 12. Provisorische Anbindung der Verbindungsstraße an die L 1066 dient der Umleitung des Verkehrs zur Herstellung des Kreisverkehrs Fornsbach
 13. Abschließende Verlegung der Abwasserdruckleitung im Bereich Beilsbach
 14. Abschließende Verlegung der Wasserleitung vom Verteilerschacht Fornsbach bis Anschluss beim Ende der Baustrecke der L 1066

15. Neubau Durchlass Beilsbach
16. Rückbau bestehender Beilsbach Durchlass
17. Neubau Kreisverkehr Fornsbach
18. Inbetriebnahme Kreisverkehr Fornsbach
19. Neubau Absperribauwerk Rückbau alter L1149 im Bereich Dammaufstandsfläche, Dammschüttung zwischen ca. Profil 0+100 und neu hergestellten L 1149 bzw. neu hergestellten Seifendamm
20. Neubau Brücke Junginger
21. Neubau Sohlengleite und Abflusspegel
22. Leitungsbau (Netzwerkabel, Strom) und Wegebau
23. Provisorische Umleitung Murr
24. Neubau Auslassbauwerk (Profil 0+060 bis 0+071)
25. Fertigstellung Absperribauwerk (Dammschüttung, Profil 0+071 bis 0+100)
26. Neubau Dammscharte (Profil 0+000 bis 0+060)
27. Rückbau der L 1149 und dem restlichen Abschnitt der alten Verbindungsstraße Rückbau der L 1149 erfolgt auf eine Breite von 3,0 m
28. Neubau Betriebsgebäude
29. Ausrüstung und Ausstattung Auslassbauwerk und Abflusspegel + Inbetriebnahme HRB Gaab

HÖHEN IM NEUEN SYSTEM I

Änderung Lagerfläche der Flurstücke 797 und 275	03.08.2020	J1 JP
ERGÄNZUNGEN	DATUM	NR.

BAUHER: Wasserverband Murtal
Marktplatz 10
71540 Murrhardt

ANERKANNTE DER BAUHER: VORABZUG

PROJEKT: Hochwasserrückhaltebecken Gaab

PLANUNGSSTAND: GENEHMIGUNG 2020

PLANBEZEICHNUNG: Lageplan Baustellenbedarfsflächen

PROJ. NR.	1804-1	MASSSTAB:	1:1000	PLANGRÖSSE:	135 x 89
PLAN NR.	1804-1-392/1	GEZEICHNET:	Luf JP	GEPRÜFT:	Rebmann
PROGRAMM:	ACAD	PPAD / DATE	Projektor1804CAD2000	Übersicht	

Riker + Rebmann

BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG VERKEHRSANLAGEN WASSERVERSORGUNG ABWASSERBESEITIGUNG ZERTIFIZIERTE KANALANLAGEBERATUNG PROJEKTMANAGEMENT

D 1760 MURRHART D 1760 MURRHART D 1760 MURRHART D 1760 MURRHART D 1760 MURRHART

TEL. 0716293599-9 FAX: 0716293599-19 E-MAIL: INGENIEURE@RIKER-REBMAN.NE

DATUM:

31.07.2020

GEFERTIGT:
